

RECEPTION DE

■ L'ECHAFAUDAGE DE PIED

■ ROULANT


■ LA TOUR ESCALIER

Classe de charge de l'échafaudage :


Mise en service Avant remise en service Trimestrielle

Ne pas dépasser les charges indiquées ci-dessous


Charges réparties (par travée)



Sur 1 niveau de plancher



Charges concentrées (par travée)



Sur niveaux de plancher



Ne pas dépasser les configurations de charges suivantes:

1 niveau chargé à 100%
+ 1 niveau chargé à 50%

POINTS DE VERIFICATION

- Répond aux besoins
- Montage et matériel conforme à la notice du fabricant
- Aspect visuel, état du matériel
- Note de calcul pour les configurations non prévues dans la notice

Protections collectives

- Plinthe
- Lisse / sous-lisse (ou main courante pour les tours escalier)
- Lisse supplémentaire sur la travée d'accès (pour les fixes et roulants)
- Garde-corps si échafaudage de pied est à + de 20 cm de l'ouvrage

Accès

- Planchers bien montés, continus, non encombrés (paliers pour les tours)
- Echelles (ou escalier pour les tours escalier)
- Trappes (non applicable aux tours escalier)

Fixation

- Liaison garde-corps / poteau
- Liaison contreventement / poteau
- Patte anti-soulèvement du plateau
- Liaison poteau / poteau
- Liaison pied / poteau

Amarrage - Stabilisation

- Amarrage sur ancrage à l'ouvrage (pour les fixes et les tours escalier)
- Stabilisateurs (pour les fixes et les roulants)
- Stabilité du terrain
- Calage des pieds (pour les fixes et les tours escalier)
- Freins en place et en bon état pour échafaudage roulant

Visa Entreprise de montage

Visa Entreprise utilisatrice :

Date :

Date :

ECHAFAUDAGE CONFORME – ACCES INTERDIT AU PERSONNEL NON AUTORISE

Liste des entreprises autorisées à utiliser l'échafaudage

Date	Société et nom du responsable	Visa

Chaque entreprise utilisatrice s'engage à ne pas le modifier et à effectuer une vérification quotidienne

ÉCHAFAUDAGES




POINTS DE VÉRIFICATION

Protections collectives

Accès

Fixations

Amarrage Stabilisation

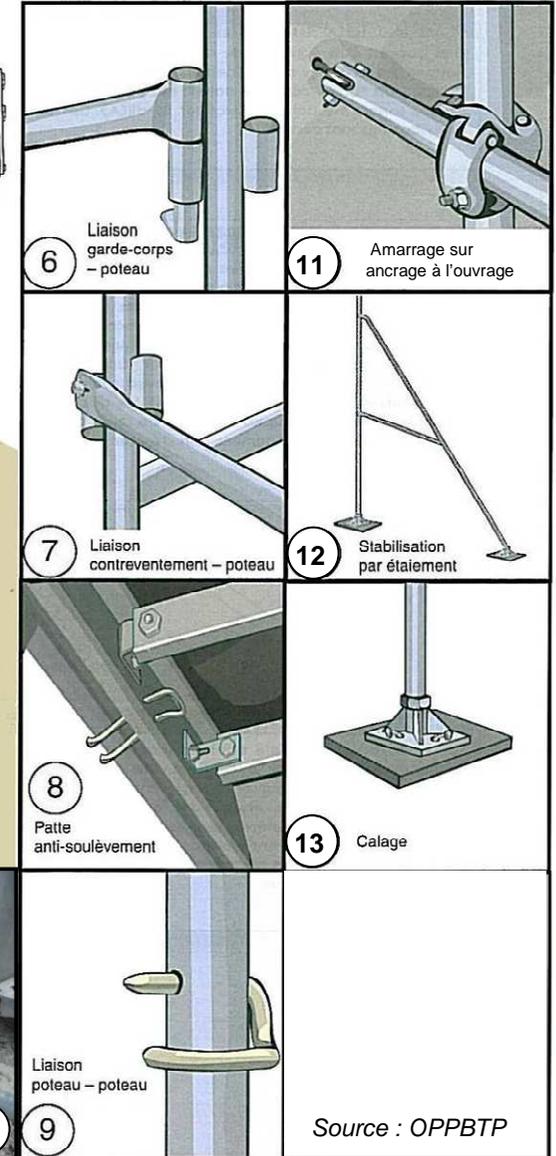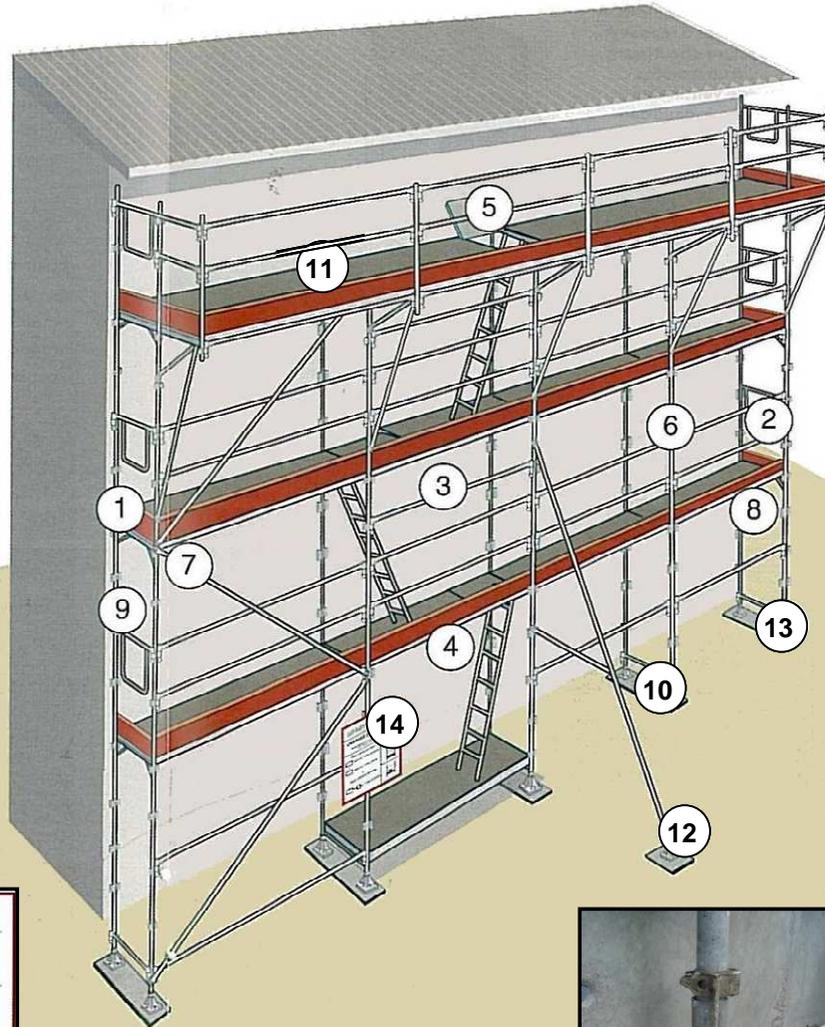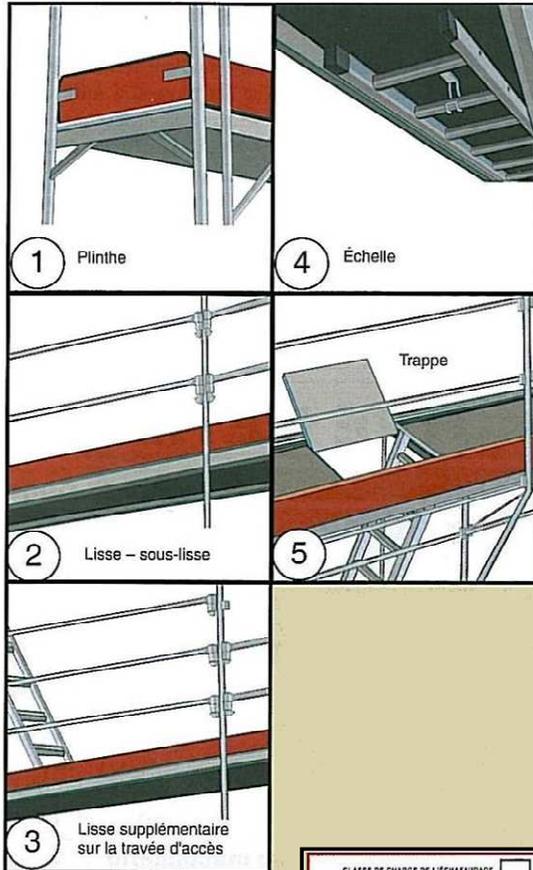

CLASSE DE CHARGE DE L'ÉCHAFAUDAGE
SUIVANT NORMES NF EN 12810-1 et 12811-1

CHARGES D'EXPLOITATION
Ne pas dépasser le nombre de planchers chargés
et les valeurs indiquées ci-dessous

Charges réparties (par travée)

500kg/m² sur 1 niveau de plancher
et 200kg/m² sur 1 niveau inférieur

ou

Charges concentrées (par travée)

20kN sur niveau de plancher

14 Panneau indicateur des charges d'exploitation



Source : OPPBTP
